


工事日程

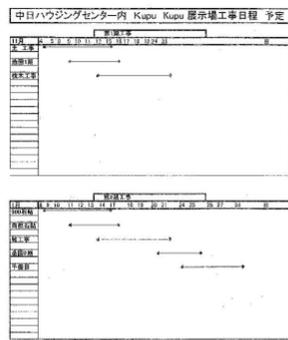

11月初旬には、植栽工事完了する。ヤシ類なので暖かい季節に植えるのが最も良いが11月までなら施工可能。12月は、バリ島からの資材待ちで、施工中断し、資材が納入する1月からスタート。完成予定は1月下旬。悪天候の場合は、工事中断。ハウジグセンター側からの約款として、週末と、祝日の工事は、中断する。その事もふまえての日程である。

工事着工前

1



11月4日 着手前の風景。ここからどう変化するのか？

高さ出し 配置確認

2



11月4日 現況の地盤高と完成地盤高、配置確認する。

掘方 スキ土

3



11月8日 中央部土のスキトリ。土は捨てずに盛土する。

植栽運搬 納入

4



11月9日 大型のワシントンヤシとココスヤシ納入。

ヤシ 植え込み

5



11月10日 ヤシの植え込み。ユニック車で吊り、植える。

組み付け工事

6



11月18日 枕木工事、女王ヤシ植え、グリ石敷き。

荷降ろし

7



1月7日 バリ島から石材便コンテナ到着。荷降ろし。

アプローチ工事

8



1月18日 オリジナル平板敷き。門柱下地工事。

石貼り、ファニチャー設置

9



1月25日 門柱石貼り。オリジナル家具レイアウト。

完成

